


PERENCANAAN INFRASTRUKTUR BLOK K

Sehubungan dengan akan di bangunnya Data Center di Blok K, maka akan dimulai Pembangunan infrastruktur FO ke area tersebut. Berikut perencanaan POE untuk mendukung hal tersebut:

No	Point Of Entry	Input Luar Kawasan	Titik Koordinat
1	RK Bogasari	1. Lotte 2. Jarakosta 3. Mekarwangi	-6.315734° 107.080586°
2	MH Cibening	Jalan Cibening - Cikedokan	-6.339638° 107.061966°
3	MH Raya Setu - Serang	Jalan Raya Setu Serang	-6.341557° 107.060200°
4	MH Sami Aji	Jalan Sami Aji	-6.335755° 107.059800°

Berikut dibawah ini adalah gambaran penarikan dari POE ke salah satu titik calon Datacenter

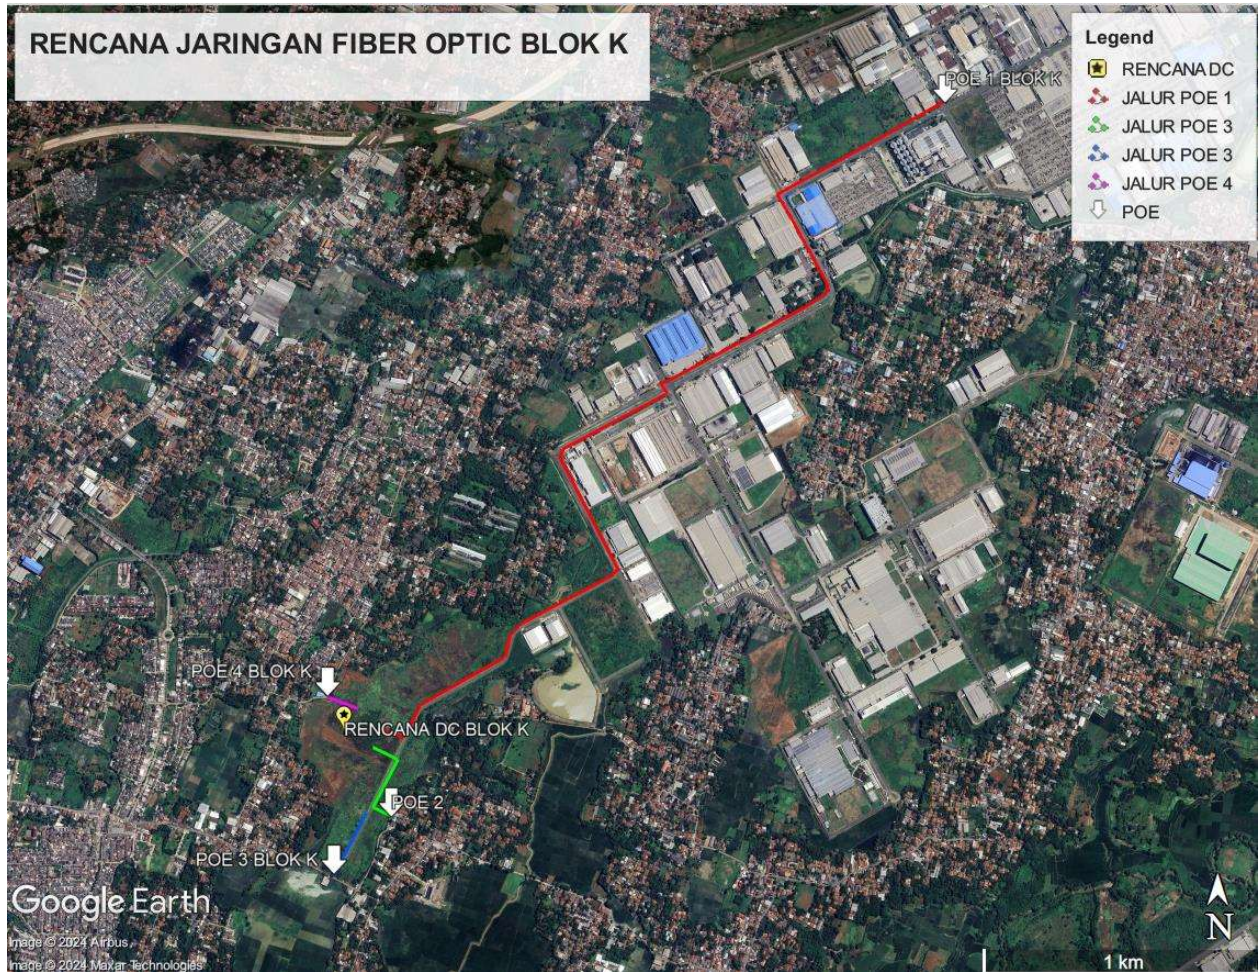

Kebutuhan terhadap Pembangunan Infrastruktur Blok K tersebut adalah :

POE 1 Blok K

No	Aktifitas	Keterangan	Qty	Satuan
1	Pembangunan Subduct RK Bogasari – Lokasi DC	1 subduct 40/33	4000	meter
2	Penarikan Kabel Fiber Optik RK Bogasari – Lokasi DC	144c	4000	meter
3	Penarikan Kabel Fiber Optik dari POE (Lotte / Mekarwangi / Jarakosta) – POE Bogasari	Dari Mekarwangi ke POE 1	2500	meter

POE 2 Blok K

No	Aktifitas	Keterangan	Qty	Satuan
1	Pembangunan Subduct MH – Lokasi DC	1 subduct 40/33	500	meter
2	Penarikan Kabel Fiber Optik MH – Lokasi DC	144c	500	meter
3	Pembangunan MH		1	unit

POE 3 Blok K

No	Aktifitas	Keterangan	Qty	Satuan
1	Pembangunan Subduct MH – Lokasi DC	1 subduct 40/33	500	meter
2	Penarikan Kabel Fiber Optik MH – Lokasi DC	144c	500	meter
3	Pembangunan MH		1	unit

POE 4 Blok K

No	Aktifitas	Keterangan	Qty	Satuan
1	Pembangunan Subduct MH – Lokasi DC	1 subduct 40/33	500	meter
2	Penarikan Kabel Fiber Optik MH – Lokasi DC	144c	500	meter
3	Pembangunan MH		1	unit

Resiko pembangunan:

POE	Keterangan
1	1. Durasi pekerjaan penarikan membutuhkan waktu +/- 3 bulan dikarenakan jarak dari POE Luar Kawasan menuju POE Bogasari cukup panjang
2	1. Letak POE bersinggungan langsung dengan jalan umum warga (Sub Jalan Raya Setu – Serang) 2. Subduct ditanam disepanjang 100meter lahan yang belum ada tenant. Sehingga akan terimpact apabila ada tenant yang membeli lahan tersebut
3	1. Letak POE bersinggungan langsung dengan jalan umum warga (Jalan Raya Setu – Serang) 2. Subduct ditanam disepanjang 100meter lahan yang belum ada tenant. Sehingga akan terimpact apabila ada tenant yang membeli lahan tersebut
4	1. Letak POE bersinggungan langsung dengan jalan umum warga (jalan Sami Aji)

	<p>2. Subduct ditanam disepanjang 100meter lahan yang belum ada tenant. Sehingga akan terimpact apabila ada tenant yang membeli lahan tersebut</p>
--	--
